

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓
ครั้งที่ ๖/๒๕๖๑
วันจันทร์ที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ผู้มาประชุม

๑	นายเสริมชัย	เชียวศิริถาวร	ผส.ชป.๑๓
๒	นายไพศาล	พงศ์นรินทร์	รอง ผส.ชป.๑๓
๓	นายสุภรัตน์	โกสุมาภินันท์	ผวศ.ชป.๑๓
๔	นายไพรัตน์	ทับประเสริฐ	ผจบ.ชป.๑๓
๕	นางสาวกิตติยา	เกียรติินรากร	แทน ผผง.ชป.๑๓
๖	นายนคร	พริ้งเพริด	ผคก.ชป.๑๓
๗	นางอรทัย	ธรรมศิริ	ผบท.ชป.๑๓
๘	นายสมศักดิ์	ทรงแสงจันทร์	วศ.๑๓ พก. แทน ผสก.๑๓
๙	นายพงษ์ศักดิ์	ฤทธิสมิต	ผคส.๑๓
๑๐	นายสุพัฒน์	ศรีไพรวรรณ	ผคป.กาญจนบุรี
๑๑	นายสมชาย	เตียวเจริญกิจ	ผคป.นครปฐม
๑๒	นายสุชาติ	กาญจนวิสัย	ผคป.ราชบุรี
๑๓	นายสุรัชชัย	นำนาผล	ผคป.สมุทรสงคราม
๑๔	นายประศาสน์	สุขอินทร์	ผคบ.ท่ามะกา
๑๕	นายภราดา	มีอำพล	ผคบ.พนมทวน
๑๖	นายกิติพงษ์	รักจรรยา	วศ.คบ.สองพี่น้อง แทน ผคบ.สองพี่น้อง
๑๗	นายฐิติพงษ์	โสภณางกูร	ผคบ.กำแพงแสน
๑๘	นายวิเชียร	เจริญศรี	ผคบ.นครชุม
๑๙	นายพงศกร	อุตตนากร	ผคบ.แม่กลอง
๒๐	นายฉัตรชัย	มีแสน	แทน ผคบ.ราชบุรีฝั่งขวา
๒๑	นายไพลิน	นุชถาวร	ผคบ.ดำเนินสะดวก
๒๒	นายคณิต	ชินวงศ์	ผคบ.บางเลน
๒๓	นายวุฒิชัย	ขาวประภา	ผจจ.๒๗
๒๔	นายอานนท์	ยิ้มแก้ว	จด.๕/๓ มด.
๒๕	นายสมพงษ์	ศรีณยุตานนท์	สร.รว.๑๓
๒๖	ว่าที่ ร.ต.สิงห์ควร	กันยะมี	แทน คร.๖ คก.
๒๗	นายอำนาจ	อรุณจิตน์	แทน คส.๖ คก.
๒๘	นายศุภชัย	เม่งพัค	ทน.๙ บอ.
๒๙	นายไชยวัฒน์	คุณพัฒนานนท์	วศ.คป.กาญจนบุรี

ประธานที่ประชุม

๓๐	นายปิยะพล	พิ่งพิน	วศ.คป.นครปฐม
๓๑	นายสุทิน	กลิ่นบุศย์	วศ.คป.ราชบุรี
๓๒	นายอัศวพงษ์	เอกนิธิอัศวภูตล	วศ.คป.ท่ามะกา
๓๓	นายประพันธ์	สพเสถียร	วศ.คป.พนมทวน
๓๔	นายเจริญศักดิ์	ทรัพย์ประดิษฐ์	วศ.คป.นครปฐม
๓๕	นายสัมพันธ์	พิรกุลวานิช	วศ.คป.กำแพงแสน
๓๖	นายสุรศักดิ์	แผ้วชมภู	วศ.คป.นครชุม
๓๗	นางสาววราพร	ศรีจันทร์	แทน วศ.คป.แม่กลอง
๓๘	นายพงษ์บริบูรณ์	กลางบุรัมย์	วศ.คป.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๓๙	นายกิตติ์ชญาชาติ	เสมอคำ	วศ.คป.ดำเนินสะดวก
๔๐	นายวรสิทธิ์	จิตรประทักษ์	วศ.คป.บางเลน
๔๑	นายพรชัย	ภูพร้อมพันธ์	วศ.คส.๑๓
๔๒	นายวัฒน์ศักดิ์	วงศ์แก้ว	จน.คป.กาญจนบุรี
๔๓	นายวินัย	อุทัยแสน	จน.คป.นครปฐม
๔๔	นายสมบัติ	วานิชชินชัย	จน.คป.สมุทรสงคราม
๔๕	นายชาติตรี	วงศ์ชื่น	จน.คป.ท่ามะกา
๔๖	นายประพันธ์	เดือนศิริรัตน์	จน.คป.นครปฐม
๔๗	นายสุวิทย์	สุขนรินทร์	จน.คป.กำแพงแสน
๔๘	นายสมใจ	อินทร์พยุง	จน.คป.สองพี่น้อง
๔๙	นายวีระศักดิ์	ทองมาก	จน.คป.นครชุม
๕๐	นายพันธุ์เทพ	โกมารกุล ณ นคร	จน.คป.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๕๑	นายธีรพงศ์	ดีเสมอ	แทน จน.คป.ราชบุรีฝั่งขวา
๕๒	นายเกียรติพงษ์	วาณิชย์เจริญ	จน.คป.ดำเนินสะดวก
๕๓	นายสุรเชษฐ	รงค์พรรณ	จน.คป.บางเลน
๕๔	นายสันติศักดิ์	ศรีวารินทร์	อบ.ชป.๑๓
๕๕	นายวิรัตน์	บุญกล้า	แทน ผง.ชป.๑๓
๕๖	นายบุญธรรม	ราชโสภา	ฟท.ชป.๑๓
๕๗	นายเสนีย์	คำเสมอ	วศ.ชป.๑๓
๕๘	นายเอกวิทย์	ก้านเหลือง	ธก.ชป.๑๓

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑	นายวิรัตน์	เจนจบ	ผคป.นครปฐม
๒	นายศีลวัตร	สิงห์มณี	ผคป.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๓	นายสุรยุทธ	สันตจิต	ผจจ.๒๘
๔	นายอดิสร	จำปาทอง	ผอช.ภาคตะวันตก
๕	นายบรรจง	ภูแก้ว	ผต.๑๓ สธ.
๖	นายวสันต์	ดวงรัตน์	คช.๖ คก.

๗	นายศานติพงษ์	เดือนศิริรัตน์	วศ.คป.สมุทรสงคราม
๘	นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสารากร	วศ.๒๗ จต.
๙	นายธีระ	อุณหะอ่อน	จน.คป.ราชบุรี
๑๐	นายณพรัตน์	กัณฑเจตน์	จน.คบ.พนมทวน
๑๑	นายเฉลิมวรรณ	อินทรชัยศรี	จน.คบ.แม่กลอง
๑๒	นายชาดู	แสงประภาเจริญ	สป.ชป.๑๓
๑๓	นายอำนาจ	ชวงษ์	บน.ชป.๑๓
๑๔	นายเสน่ห์	เขียวภักดิ์	ปป.ชป.๑๓

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นายอภิวัฒน์	สวัสต์ปุ๊ก	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๒	นายกิติศักดิ์	สว่างจิตต์	เจ้าพนักงานธุรการ
๓	นางสาวกำไรทิพย์	มากทอง	นิติกร สชป.๑๓
๔	นายศักรินทร์	ทันสมัย	วิศวกรชลประทานปฏิบัติการ
๕	นางสาววารุณี	พิณพรหมราช	นิติกรปฏิบัติการ
๖	นายพิเชษฐ	แสนยศ	นายช่างชลประทาน
๗	นายสุรศักดิ์	สังเรกาญจน์	คม.๖ คร.
๘	นางสาวณัฐกานต์	น้ำเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น.

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑) ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ สชป.๑๓ ที่ร่วมกิจกรรมเนื่องในวันสถาปนากรมชลประทานครบรอบปีที่ ๑๑๖ เมื่อวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ตามนโยบายของกรมชลประทาน

๒) เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ เป็นเดือนเฉลิมพระชนมพรรษา ๖๖ พรรษา สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขอให้ติดตามนโยบายของกรมชลประทาน จะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง

๑.๒ แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๓

๑.๒.๑ นายสุรชัย นานาผล ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส ฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครศรีธรรมราช สำนักงานชลประทานที่ ๑๕ ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ำและปรับปรุงระบบชลประทาน ย้ายมาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโครงการชลประทานสมุทรสงคราม สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑.๒.๒ นายศุภชัย เม่งพัต ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๖ (เพชรบุรี) ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานการเกษตรชำนาญงาน สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๙ (ท่าม่วง) ส่วนการใช้น้ำชลประทาน สำนักบริหารจัดการน้ำและอุทกวิทยา ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าสถานี ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๒๘/๑๒/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๘ มิถุนายน ๒๕๖๑

๑.๒.๓ นางสาว...

๑.๒.๓ นางสาวรัตติกาล ชอบคุย ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายการศึกษา สำนักงานเขตบางรัก ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๒๓๔/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑.๒.๔ นายกิตติศักดิ์ สว่างจิตต์ ตำแหน่งเจ้าพนักงานสถิติปฏิบัติงาน กลุ่มงานส่งเสริมการมีส่วนร่วม กองนโยบายและแผนงานสำนักสิ่งแวดล้อม กรุงเทพมหานคร ย้ายมาดำรงตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๗๗๕/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑.๓ แนะนำข้าราชการที่บรรจุใหม่ ตามประกาศกรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

๑.๓.๑ นางสาววราพร ศรีจันทร์ ตำแหน่งวิศวกรชลประทานปฏิบัติงาน ฝ่ายวิศวกรรมโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง สำนักงานชลประทานที่ ๑๓

มติที่ประชุม **รับทราบ**

วาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑**

วาระที่ ๓ **ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว**

๓.๑ หน้าที่ ๙ วาระที่ ๔.๒ ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ข้อ ๑ ให้ ตป.ชป.๑๓ ทำหนังสือแจ้งโครงการขอทราบความก้าวหน้าของแบบตามรายชื่อที่ ผง.ชป.๑๓ แจ้ง โดย ตป.ชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

ตป.ชป.๑๓ อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูลและจะทำรายงานสรุปอีกครั้ง

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๓.๒ หน้าที่ ๙ วาระที่ ๔.๒ ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ข้อ ๒ ให้ ผวศ.ชป.๑๓ สรุปรายละเอียดแบบเตรียมความพร้อมงานปี ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้ดำเนินการและดำเนินการแล้ว รจร. สั่งการว่าเนื่องจากแต่ละปีมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย และการเตรียมความพร้อม ในเดือนมิถุนายน รจร.จะประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณปี ๒๕๖๒ โดย ผวศ.ชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

ผวศ.ชป.๑๓ ชี้แจง ตามที่ส่วนแผนงานได้ทำหนังสือถึงส่วนวิศวกรรม ให้ช่วยตรวจสอบความพร้อมงานตามร่าง พรบ. ๖๒ ของ สชป.๑๓ มีงานทั้งหมด ๓๔ งาน มีความพร้อมของงานทั้งหมด ๓๐ งาน ไม่พร้อมอยู่ ๔ งาน มีรายชื่องานทั้งหมด ดังนี้

๑. โครงการก่อสร้างฝายทดน้ำทุ่งสามพร้อมชุดลอก โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒. ปรับปรุงสระเก็บน้ำ ศูนย์การเรียนรู้พนมทวน ตำบลหนองโรง อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี ส่งแบบอนุมัติแล้วรอดำเนินการ

๓. ชุดลอกคลองโดยรถชุดดำเนินการเอง คลองระบายน้ำคลองร.๑ขวา ตาคศ - ดำเนินสะดวก กม.๐+๐๐๐-กม.๗+๘๐๐ ตำบลบางแพ อำเภอบางแพ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ยังไม่มีแบบ

๔. ปรับปรุง...

๔. ปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ตำบลถนนขาด อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม งานของโครงการชลประทานนครปฐม มีแบบพร้อมดำเนินการ

๕. ประตุระบายน้ำ กม.๕+๕๓๐ ของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน - บางนกแขวก ตำบลลาดใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม ดำเนินการไม่ทัน

๖. ประตุระบายน้ำทับเทียม ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีแบบพร้อมดำเนินการ

๗. ปรับปรุงกำแพงป้องกันตลิ่งคลองระบายน้ำโพหัก-บัวงาม (ตอนกลาง) ระยะที่ ๔ ตำบลดอนใหญ่ อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม มีแบบพร้อมดำเนินการ

๘. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำบ้านประไรโหนด ระยะ ๒ ตำบลหนองลู อำเภอสังขละบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดำเนินการ

๙. ปรับปรุงระบบท่อส่งน้ำอ่างเก็บน้ำพุตะเคียน ตำบลสมเด็จเจริญ อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดำเนินการ

๑๐. ฝ่ายบ้านทุ่งมะขามเต่าพร้อมชุดลอก ตำบลกลอนโต อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๑๑. ฝ่ายบ้านเขาหนาม ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๑๒. ฝ่ายบ้านหนองบางพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๑๓. ฝ่ายบ้านแปดเหลี่ยมพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๑๔. ประตุระบายน้ำของคันกั้นน้ำเค็มสายอัมพวา กม.๑๕+๓๑๔ และ ๑๖+๒๓๐ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เป็นงานซ่อมแซม ใช้แบบเดิมดำเนินการ

๑๕. ประตุระบายน้ำของคันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดน-บางนกแขวก กม.๑๙+๕๖๒ และ กม.๒๐+๓๘๐ ตำบลบางช้าง,บางพรหม อำเภออัมพวา,บางคนที่ จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการชลประทานสมุทรสงคราม เป็นงานซ่อมแซม ใช้แบบเดิมดำเนินการ

๑๖. ประตุระบายน้ำคลองตาเพลิน ตำบลท่าไม้ อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม มีแบบพร้อมดำเนินการ

๑๗. ประตุระบายน้ำคลองระบายน้ำสายใหญ่-ประตู กม.๑๓+๓๔๘ ตำบลแพรกหนามแดง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา มีแบบพร้อมดำเนินการ

๑๘. ปรับปรุงคันกั้นเจดีย์ ตำบลเจดีย์ อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง อยู่ระหว่างดำเนินการสำรวจ

๑๙. ปรับปรุงคลองส่งน้ำสาย ๑ ขวา - ๕ ซ้าย ตำบลท่ามะกา อำเภอ ท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๐. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านด่านทับตะโก ๒ ตำบลด่านทับตะโก อำเภอจอมบึง จังหวัดราชบุรี งานของโครงการชลประทานราชบุรี มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๑. สถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๒. ท่อระบายน้ำปากคลองหนองศาลา กม.๒+๒๐๐ ฝั่งขวา ตำบลบ้านเล็ก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๓. ท่อระบายน้ำปากคลองสะแก กม.๑+๒๐๐ ฝั่งซ้าย ตำบลบ้านเล็ก อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๔. ทำนบป้องกันน้ำเค็มในเขตตำบลโรงเข้ ๔ แห่ง ตำบลโรงเข้ อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร งานของโครงการชลประทานสมุทร เป็นงานซ่อมแซม ใช้แบบเดิมดำเนินการ

๒๕. ประตูระบายน้ำคลองบางหลวง พร้อมเครื่องสูบน้ำ ตำบลท่าตลาด อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๖. ประตูระบายน้ำคลองต้นปลับ ตำบลนางตะเคียน อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๗. ประตูระบายน้ำคลองโพธิ์หัก - บัวงาม ตำบลดอนคา อำเภอบางแพะ จังหวัดราชบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๘. อาคารบังคับน้ำบ้านท่าไม้รวกพร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลม่วงชุม อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๒๙. ฝายทดน้ำบ้านใหม่พัฒนา ตำบลหนองปลาไหล อำเภอหนองปรือ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๓๐. ฝายบ้านเที่ยงงาม พร้อมระบบส่งน้ำ ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๓๑. ฝายทดน้ำบ้านทุ่งกระบ่า ตำบลทุ่งกระบ่า อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๓๒. ฝายบ้านน้ำลาด ตำบลทุ่งกระบ่า อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๓๓. ฝายบ้านหนองตากาย ตำบลหนองปรือ อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการก่อสร้าง มีแบบพร้อมดำเนินการ

๓๔. แก้มลิงวังตาแวว ตำบลเกาะสำโรง อำเภอเมืองกาญจนบุรี จังหวัดกาญจนบุรี งานของโครงการชลประทานกาญจนบุรี มีแบบพร้อมดำเนินการ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๓ หน้าที่ ๑๑ วาระที่ ๔.๖.๔ ผจบ.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติมว่า งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม กำหนดเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม ขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนรับช่วงต่อ และประสานงานกับทางฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ ด้วย และให้ คร.๖ คก. ทำแผนงานส่งให้กับ ผจบ.ชป.๑๓ เพื่อจะได้แจ้งกับทางโครงการและผู้ร้องเรียนเรื่องเครื่องจักรในการลงพื้นที่ โดย ผจบ.ชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

ผจบ.ชป.๑๓ ดำเนินการไปแล้วบางส่วน และจะรายงานให้ที่ประชุมทราบครั้งต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๔ หน้าที่ ๑๑ วาระที่ ๔.๖.๔ ผส.ชป.๑๓ ให้โครงการตรวจสอบปริมาณวัชพืช ถ่ายรูป และ
ทำแผนงานรายงานมาให้ ผจบ.ชป.๑๓ จะจัดทำหนังสือถึงสำนักเครื่องจักรกล และเชิญ ธรบ.มาดูพื้นที่ที่ถูก
ร้องเรียน โดย ผจบ.ชป.๑๓ รายงานความก้าวหน้า

ผจบ.ชป.๑๓ ดำเนินการไปแล้ว และจะสำเนาเสนอ ผส.ชป.๑๓ ทราบอีกครั้ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔ เรื่องเพื่อทราบ

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา โดย ผจบ.ชป.๑๓

๑. ข้อสั่งการรัฐมนตรี การพร่องน้ำไม่เกิน ๘๐% ของความจุภายในเดือน มิถุนายน
๒๕๖๑ และได้ให้คำตอบกับทางศูนย์ประมวลวิเคราะห์สถานการณ์น้ำ กรมชลประทานตอนนี่ยังพร่องน้ำไม่ได้
เนื่องจากอยู่ในช่วงต้นฤดูฝน


๒. ข้อสั่งการของกรม ให้พร่องน้ำอยู่ที่ ๘๐% ของความจุ เนื่องจากได้ชี้แจงไปแล้ว
บางส่วน ตอนนี้อยู่ในช่วง ขอให้โครงการชลประทานกาญจนบุรี และโครงการชลประทานราชบุรี ช่วยกำกับ
เจ้าหน้าที่ให้เร่งพร่องน้ำให้เหลือไม่น้อยกว่า ๘๐%

๓. กรรมการ ได้สอบถามโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา และโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา คลอง ๑ ขวา ที่เสียหายทำไมถึงไม่ได้ทำเรื่องซ่อมแซม และได้ชี้แจงว่าอยู่ในช่วงหารื้อ
ขอแจ้งผู้มีส่วนได้ส่วนเสียว่าตอนนี้ให้ชะลอน้ำไว้ทางสำนักจะซ่อมให้มีน้ำใช้ใน ช่วงถึง ๖ เดือน เมื่อแจ้งแล้ว
จะดำเนินการของงบประมาณ และจะขอหารื้อนอกรอบกับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา และโครงการ
ส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา มาชี้จุดเสียหาย พร้อมรูปถ่าย และจุดที่สำคัญในเรื่องของแบบ

๔. งานชลประทานขนาดเล็ก ขอให้โครงการชลประทานจังหวัดจัดทำบัญชีข้อมูล
เรื่องการถ่ายโอนงานและให้ตรวจสอบร่วมกับโครงการก่อสร้าง เนื่องจากบางงานโครงการก่อสร้างส่งมอบ
ให้กับ อบต. เรียบร้อยแล้ว แต่จังหวัดอาจยังไม่มีข้อมูล

๕. การบริหารน้ำอยู่ในเขตพื้นที่น้ำเค็ม ตอนนี้มีผลกระทบที่ดินที่น้ำทะเลลด ขอให้
โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก เนื่องจากน้ำลดลงไปเยอะทำให้คลองดำเนินลดต่ำไปมาก หากเป็นไปได้
ขอโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ปล่อยน้ำให้
เหมาะสมกับน้ำเค็มลงไปถึงพื้นที่ เนื่องจากเราอยู่ท้ายน้ำ

ปริมาณน้ำใช้งานได้ในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ณ วันที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๖๑

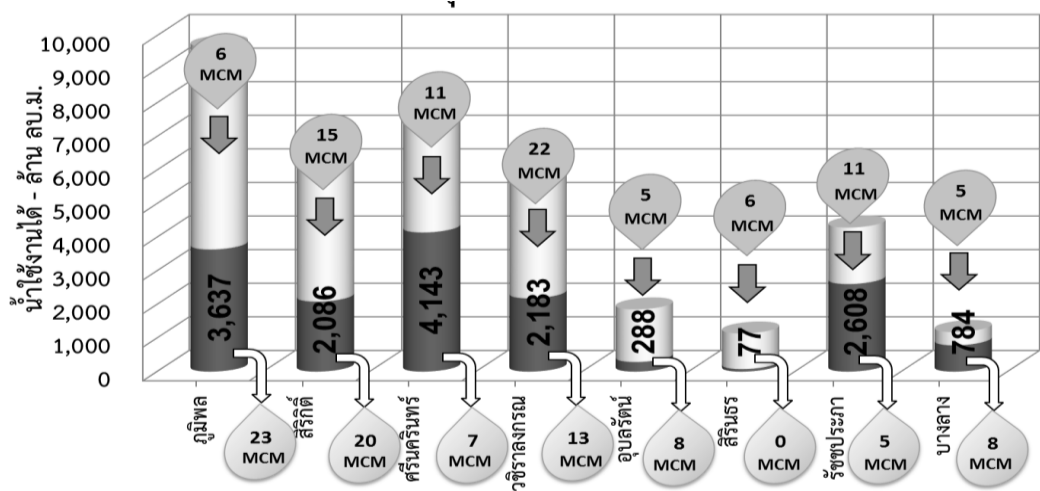

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

๔.๒ ส่วนแผนงาน โดย ตป.ชป.๑๓

๔.๒.๑ แผน - ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ผผง.ชป.๑๓


๑. ผลการเบิกจ่ายสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๒๕๖๑) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ ผลการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน ร้อยละ ๕๐.๘๗ เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๗๔.๒๙ สชป.๑๓

๒. ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายโครงการ สชป.๑๓ (ข้อมูล GFMS ณ วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑) ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๘.๓๘ ซึ่งเป้าหมายรัฐบาลไตรมาส ๓ จะต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๕.๑๑

ผลการดำเนินงานและการเบิกจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เปรียบเทียบผลการเบิกจ่ายกับเป้าหมายรัฐบาล ไตรมาส ๒ (ร้อยละ ๖๕.๑๑) ข้อมูล วันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๑

สชป.	งบประมาณโอนจัดสรร ล้านบาท	ผลการเบิกจ่าย ล้านบาท	ร้อยละผลเบิกจ่าย	ผลต่าง
รวมทั้งสิ้น	23,054.46	12,150.53		
สชป.1	1,061.05	742.15	69.94	4.83
สชป.2	1,035.49	631.14	60.95	-4.16
สชป.3	912.26	352.57	38.65	-26.46
สชป.4	974.11	536.18	55.04	-10.07
สชป.5	1,838.91	1,082.22	58.85	-6.26
สชป.6	1,651.51	907.66	54.96	-10.15
สชป.7	1,750.60	1,223.74	69.90	4.79
สชป.8	2,269.82	1,086.81	47.88	-17.23
สชป.9	1,745.03	589.21	33.77	-31.34
สชป.10	1,230.37	770.82	62.65	-2.46
สชป.11	757.90	396.03	52.25	-12.86
สชป.12	1,508.82	832.79	55.20	-9.91
สชป.13	1,080.74	521.50	48.25	-16.86
สชป.14	919.04	514.70	56.00	-9.11
สชป.15	1,922.15	587.93	30.59	-34.52
สชป.16	1,552.49	852.82	54.93	-10.18
สชป.17	660.32	439.74	66.60	1.49

๔. กราฟแสดงจัดสรรผลเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑
รายโครงการ สขป.๑๓ GFMS ณ วันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๑

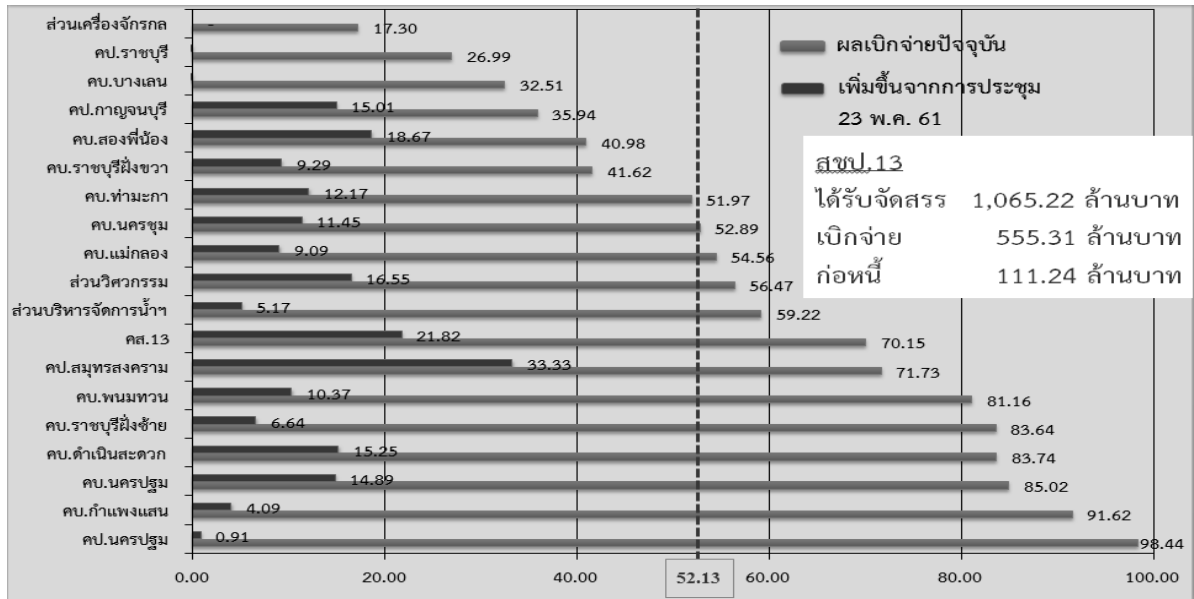

๕. ระบบติดตามออนไลน์ (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนรายการทั้งหมด	แผนงาน Cash Flow	แผนเงินเบิกจ่าย	วันอนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อจัดจ้าง งานจ้างเหมา	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ชื่อวัสดุ	รูปภาพที่สำคัญ 2 รูปภาพ	รูปภาพ 9 ขั้นตอน										
									ก่อนปฏิบัติงาน	การทำความเข้าใจกับประชาชน	รูปภาพขั้นตอน ก่อน	ระหว่าง	หลัง	สีพื้นทั้งหมด	การตรวจสอบระหว่างดำเนินการ	การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชา	การประชุมคณะผู้บังคับบัญชา	ตรวจรับและส่งมอบงาน	การรายงานผลการปฏิบัติงาน
1	ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	11	11	11	11	-	11	9	11	9	10	11	-	9	6	2	4	-	-
2	ส่วนเครื่องจักรกล	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	ส่วนวิศวกรรม	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
4	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	53	53	53	53	-	53	53	53	52	53	51	45	47	29	38	52	5	40
5	โครงการชลประทานนครปฐม	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
6	โครงการชลประทานราชบุรี	31	31	31	31	-	27	8	30	20	15	13	10	25	11	11	23	10	15
7	โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	12	12	12	12	1	12	12	12	12	12	12	-	12	12	12	-	-	
8	โครงการก่อสร้าง 13	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5	5	-	-
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	22	22	22	22	-	22	22	22	22	22	22	17	22	22	22	22	6	6
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	1	1
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก	32	32	32	32	18	13	31	32	32	32	31	25	30	28	27	32	24	24
12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา	25	25	25	25	-	25	25	25	24	24	23	20	24	9	6	24	-	-
13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	18	18	18	18	1	18	18	18	18	18	18	15	18	18	18	18	-	-
14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	87	87	87	87	23	87	57	87	68	86	65	56	82	41	26	-	11	-
15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	39	35	35	35	4	30	39	39	39	38	25	16	15	14	15	10	10	10
16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	39	39	39	39	2	39	39	39	39	39	39	37	39	39	38	38	37	37
17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	30	30	30	30	1	30	-	30	-	30	27	10	-	1	-	20	-	-
18	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	35	35	35	35	2	35	33	35	35	35	31	-	35	7	6	35	-	-
19	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย	31	30	30	31	7	31	30	30	30	29	12	30	24	11	30	11	12	12
	รวม	480	474	474	476	59	447	391	478	415	459	412	268	402	275	247	334	119	149

๖. ระบบติดตามออนไลน์ โครงการไทยนิยม ยั่งยืน ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวนรายการงานทั้งหมด	แผนงาน Cash Flow	แผนเงินเบิกจ่าย	วันอนุมัติแผนจัดซื้อ-จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง งานจ้างเหมา	ผลการจัดซื้อ-จัดจ้าง ข้อจำกัด	รูปภาพที่ สังกัด 2 รูปภาพ	รูปภาพ 9 ขั้นตอน												
									ก่อนปฏิบัติงาน	การทำความเข้าใจประชาชน	รูปภาพ 3 ขั้นตอน			ผู้บันทึก	การตรวจสอบระหว่างดำเนินการ	การตรวจเยี่ยมโดยผู้บังคับบัญชา	การประชุมผู้เกี่ยวข้อง	ตรวจรับและส่งมอบงาน	การรายงานผลการปฏิบัติงาน		
											ก่อน	ระหว่าง	หลัง								
1	ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	2	2	2	2	-	-	2	2	2	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
2	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	2	2	2	2	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
3	โครงการชลประทานนครปฐม	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	1	-
4	โครงการชลประทานราชบุรี	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
6	โครงการก่อสร้าง 13	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-
7	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	3	3	3	2	-	-	3	3	3	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
8	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาคำเนินสะดวก	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา	1	1	1	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	-	-
12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	1	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-
13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	1	1	1	-	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	2	2	2	2	-	2	2	2	2	2	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	5	5	5	5	-	-	-	5	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีมีชัย	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีมีชัย	18	18	18	16	-	-	-	18	18	16	-	-	-	-	-	18	-	-	-	-
	รวม	43	41	41	38	0	5	18	42	36	36	7	0	9	5	5	26	0	1	1	1

ผล.ชป.๑๓

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขอให้เร่งติดตามผลการเบิกจ่าย และผลงาน
๒. งานไทยนิยมยั่งยืน ขอให้ดำเนินการตามข้อกำหนดของกรมที่แจ้งมาด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

๔.๓ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๓ โดย ผสท.๑๓

มีงานดำเนินการ ๕ รายการงาน ผลการเบิกจ่ายรวมของโครงการ ร้อยละ ๘๒.๐๐ ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ มี ๒ ส่วน

๑.๑ ทำนบดิน

๑.๒ อาคารประกอบส่วนอื่นๆ

๒. อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมอาคารประกอบ

๓. อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ

โครงการเปิดใหม่ ๒ โครงการ

๑. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อพระราชดำริ

๒. สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอาคารประกอบกลอนโต - รางสาตี มี ๒ ส่วน

๒.๑ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอาคารประกอบ

๒.๒ ค่าส่วนประกอบอื่นๆ

ผล.ชป.๑๓

กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายกรมผวก ผสท.๑๓ ถ้ามีงานอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดใดขอให้ทำแผนงานส่งให้โครงการ และสำนักทราบด้วย

มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ

๔.๔ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๗ โดย ผจก.๒๗

ได้ดำเนินการงานในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน มีงานที่รับผิดชอบ ๘ งาน พื้นที่จำนวน ๖,๐๕๐ ไร่ ผลงานในภาพรวม ร้อยละ ๙๒ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๔ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๔.๕ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๘ โดย ผจก.๒๘

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม **รับทราบ**

๔.๖ หน่วยงานฝัก

๔.๖.๑ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก โดย ผอช.ภาคตะวันตก

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๖.๒ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๙ ท่าม่วง โดย ทน.๙ บอ.

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติมว่า นโยบายของ อชช. มุ่งเน้นเรื่องการอนุรักษ์ข้าวปิ่นแก้ว จึงได้สั่งกำชับให้ติดตามเรื่องพันธุ์ข้าวปิ่นแก้ว ประกอบกับสถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๙ ท่าม่วง มีพื้นที่ปลูกข้าวจำนวน ๒๐ ไร่ จึงขอให้ ทน.๙ บอ. ศึกษาเรื่องพันธุ์ข้าวปิ่นแก้วและนำมาทดลองปลูกเพื่ออนุรักษ์และขยายพันธุ์ต่อไป และจะแจ้งให้ ทน.๙ บอ. ทราบอีกครั้ง

๔.๖.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกลรถชุดที่ ๖ โดย คช.๖ คก.

ได้รับงบประมาณจากสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จำนวน ๔ โครงการ ๒๓ คลอง วงเงิน ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณดิน ๙๖๐,๐๐๐ คิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๘ ปริมาณงานร้อยละ ๗๖ ดังนี้

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม จำนวน ๑ คลอง ผลงานร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จำนวน ๖ คลอง

เสร็จแล้วจำนวน ๓ คลอง เหลือ ๓ คลอง งบประมาณ ๔ ล้านบาท

เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ ล้านบาท

๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จำนวน ๑๐ คลอง

เสร็จแล้วจำนวน ๘ คลอง เหลือ ๒ คลอง งบประมาณ ๘ ล้านบาท

ไตรมาสดิน ๔ แสกว่าคิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๑ ผลงานร้อยละ ๙๙

๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จำนวน ๖ คลอง

เสร็จแล้วจำนวน ๔ คลอง เหลือ ๒ คลอง งบประมาณ ๕ ล้านบาท

ไตรมาสดิน ๒ แสน ๖ หมื่นกว่าคิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑ ผลงานร้อยละ ๕๑

๔.๖.๔ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ โดย คร.๖ คก.

ได้รับงบประมาณจากสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ วงเงิน ๑๘,๐๐,๐๐๐ ล้านบาท ดังนี้

๑. งานชุดลอก จำนวน ๖ คลอง วงเงิน ๑๕ ล้านบาท ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๘๘

๑.๑ คลอง ร.จระเข้สามพัน - สองพี่น้อง ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๘๐

ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๙

๑.๒ คลอง ร.๓R สองพี่น้อง ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๔ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๙๙

๑.๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๑๐๐

๑.๔ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสัมปทวน คลอง ร.สายใหญ่ – กระจ๊ะสามพัน ผลงานร้อยละ ๖๖ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๔

๒. งานกำจัดวัชพืช จำนวน ๗ คลอง วงเงิน ๒ ล้านบาท ดำเนินการไปแล้วร้อยละ ๙๘

๓. งานสนับสนุนเครื่องจักร จำนวน ๑๐ คลอง

๓.๑ งานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ผลงานร้อยละ ๑๐๐

๓.๒ งานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน คลอง ร.๒ ขวา ฝั่งขวานครชัยศรี

ตอนนี้ได้นำเครื่องจักรเข้าดำเนินการแล้ว

๓.๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสัมปทวน ผลงานร้อยละ ๑๐๐

๓.๔ โครงการชลประทานนครปฐม ผลงานร้อยละ ๑๐๐

ปัจจุบันได้ของบประมาณงานกำจัดวัชพืช เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพการระบาย ของ สขป.๑๓ ได้ขอของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน คลองระบายน้ำสายใหญ่ ท่าสาร – บางปลา วงเงิน ๒ ล้านบาท วัชพืชอยู่ที่ ๖๕,๕๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้ายวงเงิน ๘๐๐,๐๐๐ บาท วัชพืชอยู่ที่ ๒๓,๐๐๐ ตัน โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง คลอง ร.กระจ๊ะสามพัน วงเงิน ๑ ล้านบาท วัชพืชอยู่ที่ ๕๐,๐๐๐ ตัน และในเขตพื้นที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง วงเงิน ๕ ล้านบาท จำนวน ๑๐ คลอง ได้ดำเนินการของบประมาณเรียบร้อยแล้วพร้อมตั้งงบประมาณ

๔.๖.๕ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ ๖ โดย ศส.๖ คก.

ได้ดำเนินการร่วมกับสำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๓ ได้ดำเนินการ ไปตามแผนที่วางไว้

ผส.ขป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ขอขอบคุณทางสำนักเครื่องจักรกลในการจัดหาเครื่องจักรใหม่ๆ โดยใช้เงินทุน หมุนเวียน ถ้าหากมีเครื่องจักรที่ไม่ใช้งานขอให้แจ้งมาทาง สขป.๑๓ ด้วย

๒. ช่วงเดือน กรกฎาคม ๒๕๖๑ จะเข้าช่วงฤดูฝน ขอให้ทางฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้าง งานดินที่ ๖ เตรียมพร้อมเครื่องจักรเครื่องมือ

ผคบ.กำแพงแสน เพิ่มเติมว่า เนื่องจากได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ ๖ แผนงานเกี่ยวกับการระบายน้ำในคลองระบายน้ำเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ไม่ทราบว่าส่ง ประมาณการไปหรือยังเนื่องจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนทำส่งทำให้เกิดการซ้ำซ้อนกัน

ศส.๖ คก. ชี้แจงว่า ในส่วนของงานโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน คลองระบายน้ำสายใหญ่ ท่าสาร - บางปลา งบประมาณ ๒ ล้านบาท ได้ทำเรื่องของบประมาณไปแล้ว

ผคบ.กำแพงแสน เพิ่มเติมว่า รอบหน้าขอให้ส่งแผนงานให้ทางโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ทราบด้วย

ผส.ขป.๑๓ เพิ่มเติมว่า ขอให้ทาง ผผง.ขป.๑๓ ช่วยตรวจสอบงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา กำแพงแสน และ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ ๖ ด้วยว่าอยู่ในขั้นตอนไหน

๔.๖.๖ ฝ่ายสำรวจ...

๔.๖.๖ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ ๑๓ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา
โดย ผศ.๑๓ สธ.

มีงานโครงการพระราชดำริ ๔ โครงการ ดำเนินการสำรวจแล้ว ๑ โครงการ
เหลืออีก ๓ โครงการ กำลังดำเนินการสำรวจ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๖.๗ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ โดย จด.๕/๓ มด.

งานจัดซื้อในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ได้ดำเนินการตามแผนเสร็จสิ้นแล้ว ในส่วนที่
เพิ่มเติมของโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย รอเงินงบประมาณเปลี่ยนแปลงค่าซื้อที่ดิน ครั้งที่ ๑ จะได้รับเงิน
งบประมาณปลายเดือนมิถุนายน และจะเบิกจ่ายในต้นเดือนกรกฎาคม

ผศ.ชป.๑๓ เพิ่มเติมว่า ขอให้ทาง จด.๕/๓ มด. ช่วยตรวจสอบ รว.๔๓ ก. เนื่องจากโครงการมีปัญหา
เกี่ยวกับการร้องเรียน และขอให้โครงการไปสำรวจพื้นที่ของตนเองกับพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน โดยเฉพาะโครงการ
ชลประทานราชบุรี และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ให้ประสานงานกับ จด.๕/๓ มด. และ สร.รว.๑๓
ช่วยตรวจสอบด้วย

๔.๖.๘ สำรวจกันเขต ๑๓ ฝ่ายสำรวจกันเขตที่ ๔ โดย สร.รว.๑๓

ได้รวบรวมแผนงานตั้งแต่ปี พ.ศ.๒๕๕๖ - ๒๕๖๑ มอบให้ ผศ.ชป.๑๓ ไปแล้ว
สรุปงานปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มี ๖ โครงการ ดังนี้

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง

๑.๑ คลองระบายน้ำ ๑ ขวา - บางยี่เส

๑.๒ คลองระบายน้ำบ้านยาง ๒ ขวา - บ้านยาง

๑.๓ คลอง ๖ ขวา - จะเข้สามพัน

๑.๔ คลอง ๗ ขวา - จระเข้สามพัน

๑.๕ คลองส่งน้ำ ๑ ซ้าย - ๒ ขวา - ๕ ซ้าย - ๒ ซ้าย และหัวงาน ดำเนินการแล้วเสร็จ

๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน

๒.๑ คลองจระเข้สามพัน

๒.๒ คลอง ร.๗ ซ้าย จระเข้สามพัน

๒.๓ คลอง ร.๑๐ ซ้าย ท่าสาร - บางปลา

๒.๔ คลอง ร.๑ ซ้าย - ๑๐ ซ้าย ท่าสาร - บางปลา

๒.๕ คลอง ร.๒ ซ้าย - ๑๐ ซ้าย ท่าสาร - บางปลา ดำเนินการแล้วเสร็จ

๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง

มีบริเวณหัวงานและคลองระบายน้ำจระเข้สามพัน กำลังดำเนินการ

๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก

มีคั้นน้ำเค็ม สมุทรสงคราม - สมุทรสาคร ช่วงที่ ๑ ช่วงที่ ๒ และคลอง

เลียบบคั้นกั้นน้ำเค็ม กำลังดำเนินการ

๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย

คลอง ๑๒ ซ้าย และ คลอง ร.๑ ขวา ตาคต - ดำเนินสะดวก กำลังดำเนินการ

๖. โครงการอ่างเก็บน้ำลำตะเพิน

บริเวณอ่างเก็บน้ำ และถนนเข้าโครงการ กำลังดำเนินการ

ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติมว่า สำหรับโครงการที่ได้รับงบประมาณแล้วมีช่างเพียงพอไหม ถ้าไม่พอทางสำนักจะหาช่างมาให้

สร.รว.๑๓ ชี้แจงว่า จะขอปรึกษาคุณสาธารณสุข ก่อนถ้าไม่พอจะขอช่างจากที่อื่นมาช่วย

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องเพื่อพิจารณา

๕.๑ การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ โดย ผศบ.กำแพงแสน

ตามที่โครงการได้หารือ เรื่องบุกรุกที่ราชพัสดุในเขตที่โครงการรับผิดชอบ ครั้งแรกได้ทำการเตือนผู้บุกรุกอย่างน้อย ๓ ครั้ง และได้ทิ้งช่วงเวลาไว้แล้วดำเนินการอีกครั้งโดยการฟ้องร้องแจ้งความ ซึ่งทำให้เกิดปัญหาเนื่องจากทางอัยการได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วตอนที่แจ้งไปเป็นการบุกรุกที่ราชพัสดุหรือที่สาธารณะ และได้ทำหนังสือมาทางสำนักเพื่อหารือ แนวทางแก้ไข หลังจากที่เราช่อมหลักเขตแล้ว ได้ รว.๔๓ ก. มาแล้ว เมื่อเกิดการฟ้องร้องขึ้นมา เอกสารมี รว.๔๓ ก. ไม่สามารถดำเนินการอะไรได้จำเป็นต้องใช้หลักการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ

ผบท.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้ จด.๕/๓ มต. ชี้แจงการออกหนังสือสำคัญทางหลวง หรือการขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ และการจัดทำแบบ ทร.๐๓

จด.๕/๓ มต. ชี้แจงว่า การขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุเป็นหน้าที่ของฝ่ายจัดหาที่ดิน กระบวนการทำงานเริ่มตั้งแต่ จัดซื้อ จ่ายเงิน และจดทะเบียนกับสำนักงานที่ดิน เสร็จเรียบร้อยแล้ว จะนำหลักฐานประเภทสัญญาซื้อขายที่ทำจากสำนักงานที่ดิน โฉนดที่ดิน รว.๔๓ ก. และ ทร.๐๓ แบบสำรวจรายการที่ดินส่งให้ทางจัดหาที่ดิน มีหนังสือส่งไปแต่พื้นที่เพื่อนำไปขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ ซึ่งทางธนากรักษ์ได้รับแล้วก็จะตอบกลับมาจะมีแบบ ทร.๐๑ ส่งกลับมาว่าที่ดินแปลงดังกล่าวที่เราซื้อจะขึ้นทะเบียนที่ราชพัสดุ มีเลขประจำตัวขึ้นด้วย ส คือที่สาธารณะ และลงอักษรย่อของจังหวัดตามด้วยตัวเลข และเลขแปลง

ผส.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. เรื่องการประสานกับทางกองกฎหมายที่ดินแปลงของคุณทรงธรรม ทางสำนักได้ติดตามแต่ไม่สามารถชี้ขาดได้ชัดเจน ขอให้รังวัดใหม่ให้ชัดเจน

๒. เนื่องจากในเขตพื้นที่ สชป.๑๓ จะมีความเจริญในเรื่องของมอเตอร์เวย์ ปัญหาที่ตามมาคือการบุกรุกที่ดินของที่ราชพัสดุซึ่งอยู่ในความดูแลของสำนัก ขอให้แต่ละโครงการหาแนวทางป้องกัน และหาข้อมูลให้มากขึ้นเพื่อแก้ไขปัญหาที่จะตามมา

ผบท.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. กรณีงานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน การอนุญาตใช้ที่ราชพัสดุในการฝังท่อแก๊สทางโครงการไม่มี ทร.๐๑ ต้องประสานกับใคร

๒. การจัดทำ ทร.๐๓ เป็นหน้าที่ของ จด.๕/๓ มต. หรือโครงการต้องดำเนินการเอง

จด.๕/๓ มต. ชี้แจง ดังนี้

๑. ได้รับแจ้งมาจากธนากรักษ์ ใช้หลักฐานการจดทะเบียนซื้อขาย

๒. ฝ่ายจัดหาที่ดินเป็นผู้ดำเนินการเอง

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ ขอให้โครงการที่ไปร่วมกับจังหวัด ด้านนโยบายของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์
สำเนามาให้ทาง รอง ผส.ชป.๑๓ ด้วย

๖.๒ แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ (KM Action Plan ๒๐๑๘)
สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จัดทำคู่มือจำนวน ๒๐ เล่ม ระยะเวลาการดำเนินการ ระหว่างเดือนมีนาคม ถึง
เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ โดยมีรายชื่อคู่มือ ดังนี้

๑. คู่มือสิทธิประโยชน์พนักงานราชการ
๒. คู่มือการจัดทำและตรวจสอบใบสำคัญ
๓. คู่มือการตรวจสอบพัสดุประจำปีและการจำหน่ายพัสดุ
๔. คู่มือเทคนิคการเขียนข่าว
๕. คู่มือการจัดทำแผนงานและงบประมาณรายจ่าย ประจำปีและรายจ่ายล่วงหน้าปานกลาง
๖. คู่มือการประชาสัมพันธ์ข้อมูลการดำเนินงาน โครงการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
๗. คู่มือการจัดทำรายงานการศึกษาเบื้องต้น (Reconnaissance Study)
๘. คู่มือการสำรวจธรณีวิทยาฐานรากเขื่อน
๙. คู่มือหลักการออกแบบระบบท่อส่งน้ำชลประทานรับแรงดัน
๑๐. คู่มือการตรวจสอบคุณภาพงานก่อสร้าง อ่างเก็บน้ำขนาดเล็ก สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
๑๑. คู่มือการบริหารจัดการน้ำ สำนักงานชลประทานที่ ๑๓
๑๒. คู่มือแผนงานซ่อมแซมบำรุงรักษาและแผนงาน ปรับปรุงระบบชลประทาน
๑๓. คู่มือการขึ้นบัญชีและขึ้นทะเบียนองค์กรผู้ใช้น้ำ
๑๔. คู่มือการตรวจสภาพเขื่อนดิน
๑๕. คู่มือการการคำนวณและเลือกใช้ เครื่องสูบน้ำให้เหมาะกับงาน
๑๖. คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลและยานพาหนะ
๑๗. คู่มือการบำรุงรักษาเครื่องจักรกลสูบน้ำ
๑๘. คู่มือการบริหารจัดการน้ำของโครงการ
๑๙. คู่มือเทคนิคการควบคุมอาคารชลประทาน
๒๐. คู่มือการขอใช้ที่ราชพัสดุและที่ดินของรัฐประเภทอื่น ที่กรมชลประทานใช้ประโยชน์

การดำเนินการตามแผนปฏิบัติการจัดการความรู้ของสำนักงานชลประทานที่ ๑๓
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ โดยรายงานความก้าวหน้า
และผลการดำเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ จำนวน ๓ ครั้ง ดังนี้

ครั้งที่ ๑ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑ - ๑๕ กันยายน ๒๕๖๑

๖.๓ คู่มือพัสดุ การจัดซื้อ/จัดจ้าง ขอให้โครงการที่ได้เล่มคู่มือแล้วนำไปเผยแพร่ เพื่อเป็นคู่มือ
ในการจัดทำพัสดุ

๖.๔ อรช. ซักซ้อมการชี้แจงคณะกรรมการธิการ ปี ๒๕๖๒ โดยการถ่ายทอดการประชุม VDO Conference แผนบูรณาการทำการชี้แจงช่วงเช้า - ช่วงบ่าย ขอให้สำนัก Standby ช่วงเช้า และขอให้โครงการเตรียมความพร้อม ในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ ช่วงบ่าย ๑ แผ่น ๑ โครงการ เชื่อมโยงยุทธศาสตร์ใด ควรตอบให้ตรงประเด็นไม่เกิน ๕ นาที

๖.๕ ขอให้โครงการรายงานการเพราะปลูกพืชฤดูแล้ง ความพร้อมของน้ำและปัญหาต่างๆ โครงการใดรายงานแล้ว ขอให้อัปเดตข้อมูลด้วย

๖.๖ ขอให้เตรียมการช่วงเดือนกรกฎาคม โครงการใดยังไม่ได้ปลูกต้นรวงผึ้งขอให้เร่งดำเนินการ และรายงานผลด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

นางสาวณัฐกานต์ น้ำเพชร ผู้จัดรายงานการประชุม

นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
