

รายงานการประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓
ครั้งที่ ๕/๒๕๖๑

วันพุธที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๔.๐๐ น.
ณ ห้องประชุมสำนักงานชลประทานที่ ๑๓

ผู้มาประชุม

			ประธานที่ประชุม
๑	นายเสริมชัย	เชียวศิริถาวร	ผส.ชป.๑๓
๒	นายไพศาล	พงศ์นรภัทร	รอง ผส.ชป.๑๓
๓	นายกิติพงษ์	เกียรติินรากร	พค.ชป.๑๓ แทน ผวศ.ชป.๑๓
๔	นายไพรัตน์	ทับประเสริฐ	ผจบ.ชป.๑๓
๕	นายราวี	สอนคุณแก้ว	ผง.ชป.๑๓ แทน ผผง.ชป.๑๓
๖	นายนคร	พริ้งเพริด	ผคก.ชป.๑๓
๗	นางอรทัย	ธรรมศิริ	ผบท.ชป.๑๓
๘	นายสมศักดิ์	ทรงแสงจันทร์	วศ.๑๓ พก. แทน ผสก.๑๓
๙	นายพงษ์ศักดิ์	ฤทธิสมิต	ผคส.๑๓
๑๐	นายวัฒนศักดิ์	วงศ์แก้ว	จน.คป.กาญจนบุรี แทน ผคป.กาญจนบุรี
๑๑	นายสมชาย	เตียวเจริญกิจ	ผคป.นครปฐม
๑๒	นายสุทิน	กลั่นบุศย์	วศ.คป.ราชบุรี แทน ผคป.ราชบุรี
๑๓	นายสมบัติ	วานิชชินชัย	จน.คป.สมุทรสงคราม แทน ผคป.สมุทรสงคราม
๑๔	นายอัศวพงษ์	เอกนิธิอัครภูตล	วศ.คบ.ท่ามะกา แทน ผคบ.ท่ามะกา
๑๕	นายภราดา	มีอำพล	ผคบ.พนมทวน
๑๖	นายวิรัตน์	เจนจบ	ผคบ.นครปฐม
๑๗	นายวรพจน์	เพชรนรชาติ	ผคบ.สองพี่น้อง
๑๘	นายฐิติพงษ์	โสภณางกูร	ผคบ.กำแพงแสน
๑๙	นายวิเชียร	เจริญศรี	ผคบ.นครชุม
๒๐	นายพงศกร	อุตตนากร	ผคบ.แม่กลอง
๒๑	นายกิตติศักดิ์	สุภาณี	จน.คป.ราชบุรีฝั่งขวา แทน ผคป.ราชบุรีฝั่งขวา
๒๒	นายพงษ์บริบูรณ์	กลางบุรีมย์	วศ.คบ.ราชบุรีฝั่งซ้าย แทน ผคป.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๒๓	นายกิตติชัญชาติ	เสมคำ	วศ.คบ.ดำเนินสะดวก แทน ผคป.ดำเนินสะดวก
๒๔	นายสุรเชษฐ	รงค์พรรณ	จน.คบ.บางเลน แทน ผคป.บางเลน
๒๕	นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสารากร	วศ.๒๗ จด. แทน ผจจ.๒๗
๒๖	นายสมเกียรติ	คำทวี	แทน ผอช.ภาคตะวันตก
๒๗	นางพิมพ์กมล	ศรีพัลลพ	แทน จด.๕/๓ มด.
๒๘	นางสาวจินตรา	สุวรรณภูมิ	แทน สร.รว.๑๓
๒๙	นายบรรจง	ภูแก้ว	ผด.๑๓ สธ.

๓๐	นายสุรศักดิ์	สังวรกาญจน์	แทน คร.๖ คก.
๓๑	นายวสันต์	ดวงรัตน์	แทน คช.๖ คก.
๓๒	นายจารึก	สินธุ์รัตน์	ทน.๙ บอ.
๓๓	นายชวพทธี	รักงาม	สบ.๒ คป. แทน วศ.คป.กาญจนบุรี
๓๔	นายปิยะพล	พึงพิน	วศ.คป.นครปฐม
๓๕	นายศานติพงษ์	เดือนศิริรัตน์	วศ.คป.สมุทรสงคราม
๓๖	นายประพันธ์	สพเสถียร	วศ.คป.พนมทวน
๓๗	นายเจริญศักดิ์	ทรัพย์ประดิษฐ์	วศ.คป.นครปฐม
๓๘	นายสัมพันธ์	พิรกุลวานิช	วศ.คป.กำแพงแสน
๓๙	นายกิติพงษ์	รักจรรยา	วศ.คป.สองพี่น้อง
๔๐	นายสุรศักดิ์	แผ้วชมภู	วศ.คป.นครชุม
๔๑	นายบุญฤทธิ์	สิริกานจนชัยกุล	วศ.คป.แม่กลอง
๔๒	นายพงษ์บริบูรณ์	กลางบุรีรัมย์	วศ.คป.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๔๓	นายวรสิทธิ์	จิตรประทีภย์	วศ.คป.บางเลน
๔๔	นายพงษ์ศักดิ์	ศรีสารากร	วศ.๒๗ จด.
๔๕	นายพรชัย	ภูพร้อมพันธุ์	วศ.คส.๑๓
๔๖	นายวินัย	อุทัยแสน	จน.คป.นครปฐม
๔๗	นายชาติรี	วงศ์ชื่น	จน.คป.ท่ามะกา
๔๘	นายนพรัตน์	กัณฑเจตน์	จน.คป.พนมทวน
๔๙	นายประพันธ์	เดือนศิริรัตน์	จน.คป.นครปฐม
๕๐	นายสุวิทย์	สุขนรินทร์	จน.คป.กำแพงแสน
๕๑	นายสมใจ	อินทร์พยุ่ง	จน.คป.สองพี่น้อง
๕๒	นายวีระศักดิ์	ทองมาก	จน.คป.นครชุม
๕๓	นายพันธุ์เทพ	โกมารกุล ณ นคร	จน.คป.ราชบุรีฝั่งซ้าย
๕๔	นายเกียรติพงษ์	วาณิชย์เจริญ	จน.คป.ดำเนินสะดวก
๕๕	นายสันติศักดิ์	ศรีวารินทร์	อบ.ชป.๑๓
๕๖	นางสาวกิตติยา	เกียรตินรากร	ตป.ชป.๑๓
๕๗	นายอำนาจ	ชวงษ์	บน.ชป.๑๓
๕๘	นายเสน่ห์	เชี่ยวชาญดี	ปบ.ชป.๑๓
๕๙	นายเสนีย์	คำเสมอ	วค.ชป.๑๓
๖๐	นายบุญธรรม	ราชโสภา	ฟท.ชป.๑๓
๖๑	นายเอกวิทย์	ก้านเหลือง	ธก.ชป.๑๓

ผู้ไม่มาประชุม (ติดราชการ)

๑	นายสุรยุทธ	สันตจิต	ผจจ.๒๘
๒	นายณรงค์	วงศ์ศิริ	คส.๖ กก.
๓	นายธีระ	อุณหะอ่อน	จน.คป.ราชบุรี
๔	นายเฉลิมวรรษ	อินทรชัยศรี	จน.คบ.แม่กลอง

ผู้เข้าร่วมประชุม

๑	นางดาราวรรณ	ม่วงงาม	ช่างเขียน ช๓
๒	นายสุรชัย	กลีนาค	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๓	นางสาววารุณี	พิณพรมราช	นิติกร สขป.๑๓
๔	นายวิรัตน์	บุญกล้า	นายช่างชลประทานปฏิบัติงาน
๕	นางสาวกำไรทิพย์	มากทอง	นิติกร สขป.๑๓
๖	ว่าที่ร้อยตรีสิงห์ควร	กันยะมี	ปก. ๖.๒-๖.๓
๗	นายจารึก	ม่วงงาม	ช่างเขียน ช๓
๘	นางสาวณัฐกานต์	น้ำเพชร	เจ้าพนักงานธุรการ

เริ่มประชุมเวลา ๑๔.๐๐น.

ประธาน กล่าวเปิดการประชุมและดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระต่างๆ ดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑.๑ เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

๑) ข้อสั่งการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ในวันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เน้นกำชับข้อ ๒ ให้เจ้าหน้าที่กรมชลประทานประสานงานกับเกษตรกรชุมชนเดือนละครั้งเพื่อให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานการณ์น้ำตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และข้อ ๓ ข้อมูลการบริหารจัดการน้ำและพัฒนาแหล่งน้ำตามที่ประสบผลสำเร็จเป็นรายภาค

๒) ให้โครงการชลประทานราชบุรี และโครงการก่อสร้าง ดำเนินการเรื่องด่วนงานของ องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก และมอบหมายให้ ผศส.๑๓ เข้าร่วมประชุมที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางหัก เวลา ๑๐.๐๐ น. ศาลาเอนกประสงค์บ้านหินสี หมู่ที่ ๔ ตำบลยางหัก

๓) ขอให้ ผวศ.ขป.๑๓ มอบหมายให้ ปธ.ขป.๑๓ ลงพื้นที่ดำเนินการเรื่องเจาะบ่อบาดาล ให้โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน เวลา ๑๐.๐๐ น. และอธิบายขั้นตอนการทำงานให้กับเจ้ากรมทหาร

๑.๒ แนะนำข้าราชการที่ย้ายมาปฏิบัติงานที่ สำนักงานชลประทานที่ ๑๓

๑.๒.๑ นายวิรัตน์ เจนจบ ตำแหน่งนายช่างชลประทานอาวุโส ฝ่ายก่อสร้างที่ ๔ โครงการก่อสร้าง สำนักงานชลประทานที่ ๒ (ปฏิบัติหน้าที่หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างที่ ๔) ย้ายมาดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖๖๙/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑.๒.๒ นายสุรชัย กลิ่นนาค ตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๔ ย้ายมาดำรงตำแหน่งนายช่างเครื่องกลปฏิบัติงาน ส่วนเครื่องจักรกล สำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ตามคำสั่งกรมชลประทาน ที่ ข ๖๑๑/๒๕๖๑ ลงวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๑

มติที่ประชุม **รับทราบ**

วาระที่ ๒ **เรื่องรับรองรายงานการประชุม**

ประธานเสนอให้ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑ ซึ่งที่ประชุมพิจารณาแล้ว มีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไขแต่อย่างใด

มติที่ประชุม **รับรองรายงานการประชุม ครั้งที่ ๔/๒๕๖๑ เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๖๑**

วาระที่ ๓ **ติดตามผลการประชุมตามมติครั้งที่แล้ว**

ไม่มี

มติที่ประชุม **รับทราบ**

วาระที่ ๔ **เรื่องเพื่อทราบ**

๔.๑ ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา โดย บ.น.ช.ป.๑๓

๔.๑.๑ รายงานสภาพฝน สถานการณ์น้ำ แผนการจัดสรรน้ำ การเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๑
สรุปการคาดการณ์สภาพอากาศ ๗ วันข้างหน้า ช่วงวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ถึง


๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประเทศไทยจะมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

ข้อควรระวัง ในวันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ขอให้ประชาชนบริเวณประเทศไทยระวังอันตรายจากฝนตกหนัก และฝนที่ตกสะสมไว้ด้วย สำหรับชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรเดินเรือด้วยความระมัดระวังในขณะที่มีฝนฟ้าคะนอง

ลักษณะสำคัญทางอุตุนิยมวิทยา ในช่วงวันที่ ๑๕ - ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมประเทศไทยมีกำลังอ่อนลง ทำให้บริเวณประเทศไทยมีฝนลดลง ส่วนในช่วงวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ คลื่นกระแสลมตะวันตกจากประเทศเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ประกอบกับมีลมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและภาคใต้ ทำให้ประเทศไทยมีฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น

ปริมาณน้ำใช้งานได้ในอ่างเก็บน้ำ กฟผ. ณ วันที่ ๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑

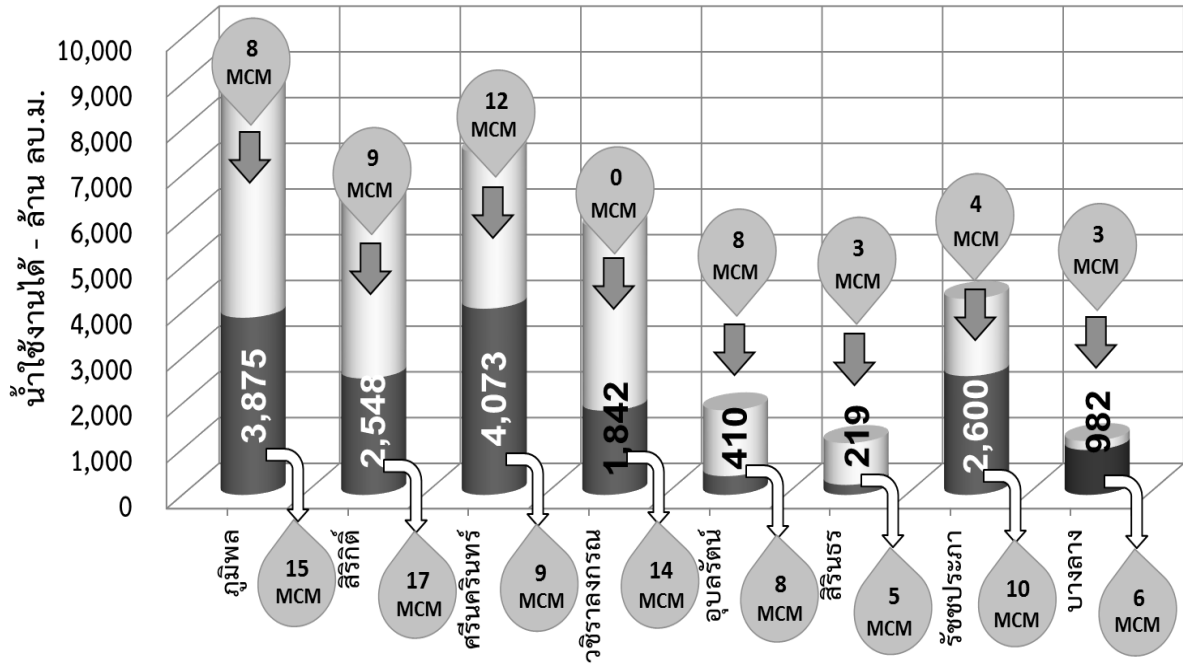

สถานการณ์น้ำ เขื่อนวชิราลงกรณ และเขื่อนศรีนครินทร์ ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

- เขื่อนวชิราลงกรณ

น้ำไหลเข้า	๖.๙๐	ล้านลูกบาศก์เมตร
น้ำใช้การ	๑,๗๗๕.๐๗	ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ ๓๐.๓๕
- เขื่อนศรีนครินทร์

น้ำไหลเข้า	๙.๕๒	ล้านลูกบาศก์เมตร
น้ำใช้การ	๔,๐๖๙.๔๙	ล้านลูกบาศก์เมตร ร้อยละ ๕๔.๔๐

แผนการจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชฤดูฝนปี ๒๕๖๑

มาตรการของกรมชลประทานในการบริหารจัดการน้ำในช่วงฤดูฝน ปี ๒๕๖๑ เพื่อให้ปริมาณน้ำต้นทุนในอ่างเก็บน้ำมีเพียงพอสำหรับการใช้น้ำตลอดฤดูฝน ๒๕๖๑ และเก็บกักไว้ใช้ในฤดูแล้งที่จะถึง กรมชลประทานพิจารณาดำเนินการดังนี้

- จัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศให้เพียงพอตลอดทั้งปี
- การส่งเสริมการปลูกพืชฤดูฝนให้ใช้น้ำฝนเป็นหลัก ใช้น้ำชลประทานเสริมกรณีฝนทิ้งช่วงเท่านั้น
- บริหารจัดการน้ำทำให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ด้วยระบบและอาคารชลประทาน
- ดำเนินการเก็บกักน้ำในเขื่อนให้มากที่สุด ไม่ต่ำกว่าเกณฑ์เก็บกักน้ำต่ำสุดตามช่วงเวลา เพื่อความมั่นคงด้านการอุปโภค - บริโภค และรักษาระบบนิเวศ

การจัดสรรน้ำและเพาะปลูกพืชในช่วงฤดูแล้งปี ๒๕๖๐/๒๕๖๑ ข้อมูล ณ วันที่

๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑

ภาค	ข้าวนาปรัง				พืชไร่-พืชผัก				รวม			
	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เกี่ยว (ล้านไร่)	แผน (ล้านไร่)	ผล (ล้านไร่)	%	เกี่ยว (ล้านไร่)
เหนือ	0.50	0.93	186.49	0.59	0.24	0.27	115.68	0.24	0.73	1.20	163.77	0.83
ตะวันออกเฉียงเหนือ	1.04	1.16	111.52	0.33	0.08	0.06	78.10	0.03	1.12	1.22	109.25	0.37
กลาง	0.06	0.06	97.89	0.02	0.002	0.001	50.95	0.001	0.06	0.06	96.32	0.02
ตะวันออก	0.29	0.32	108.23	0.29	0.06	0.05	87.16	0.03	0.35	0.37	104.60	0.31
ตะวันตก	1.08	1.04	96.14	0.11	0.24	0.17	73.68	0.06	1.32	1.21	92.11	0.17
ใต้	0.21	0.11	53.93	0.02	0.03	0.01	46.64	0.002	0.24	0.13	53.01	0.02
ลุ่มน้ำเจ้าพระยา	5.17	5.89	113.93	5.21	0.06	0.06	104.32	0.05	5.23	5.95	113.81	5.26
ทั่วประเทศ	8.35	9.51	113.86	6.57	0.70	0.64	90.88	0.41	9.05	10.15	112.07	6.98

ผจบ.ชป.๑๓

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. หลังจากผ่านฤดูฝนไปแล้วคาดการณ์ว่าการใช้น้ำในฤดูแล้ง มีปริมาณน้ำเพียงพอต่อความต้องการ
๒. ขอความร่วมมือ ผอ.โครงการ วศ. และ จน. ช่วยประสานงานเจ้าหน้าที่ในส่วนที่ปฏิบัติงานระดับล่างด้วย
๓. ข้อเสนอการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้รายงานเข้ามาและมอบหมาย

ให้มีผู้รับผิดชอบดำเนินการด้วย

๔. ขอขอบคุณโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา ที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับองค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ในพื้นที่คลองบางสองร้อย โดยใช้เครื่องจักรจาก สชป.๑๓ และเครื่องจักรขององค์การบริหารส่วนตำบลธรรมเสน โดยมีนายกองค้ำการการบริหารส่วนตำบลธรรมเสน ให้การสนับสนุน

๕. แผนงานกำจัดวัชพืช ณ ปัจจุบัน ได้ดำเนินการจัดส่งกรม เรียบร้อยแล้ว

๖. ขอความร่วมมือโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน วางแผนการเพาะปลูกอย่างรัดกุมด้วย

๗. ขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย ตรวจสอบน้ำในคลองตาคต - ดำเนิน และสำรวจผักตบชวาที่กำลังดำเนินการอยู่ โดยใช้เครื่องจักรเครื่องมือที่มีอยู่ให้ได้มากที่สุด

ผส.ชป.๑๓

กล่าวเพิ่มเติมว่า ในการบริหารน้ำจัดการน้ำอ่างเก็บน้ำขนาดกลางที่เกิน ร้อยละ ๘๐ ขอให้อัปเดตข้อมูลและบริหารจัดการตามแผนที่เสนอกกรม เนื่องจากข้อมูลนี้จะต้องส่งถึงสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ

ผคก.ชป.๑๓

หารือที่ประชุมว่า เครื่องสูบน้ำที่ได้นำไปช่วยเหลือโครงการที่มีผลกระทบกับน้ำท่วมแบบเร่งด่วนเรื่องน้ำมันเชื้อเพลิง ขอให้ใช้ของโครงการก่อนแล้วค่อยเบิกของสำนักไปทดแทนภายหลังได้หรือไม่

ผจบ.ชป.๑๓

ชี้แจงว่า ขณะนี้สำนักยังไม่ได้รับงบประมาณเชื้อเพลิง ขอให้ใช้น้ำมันเชื้อเพลิง ของโครงการดำเนินการไปพลางก่อน


มติที่ประชุม

รับทราบและดำเนินการ


๔.๒ ส่วนแผนงาน โดย ผผง.ชป.๑๓

๔.๒.๑ แผน - ผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดย ผผง.ชป.๑๓

- ผลการเบิกจ่ายสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุน (พ.ร.บ. ๒๕๖๑) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๖๑ ผลการเบิกจ่ายของกรมชลประทาน ร้อยละ ๔๔.๒๒ เป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๕๐.๔๔ สชป.๑๓ ร้อยละ ๓๕.๘๙ ต่ำกว่าเป้าหมายรัฐบาล ร้อยละ ๑๔.๕๕
- ผลการเบิกจ่ายงบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ รายโครงการ สชป.๑๓ (ข้อมูล GFMIS ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑) ในภาพรวมเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๔๐.๗๒ ซึ่งเป้าหมายรัฐบาลไตรมาส ๓ จะต้องเบิกจ่ายได้ ร้อยละ ๖๗.๗๕

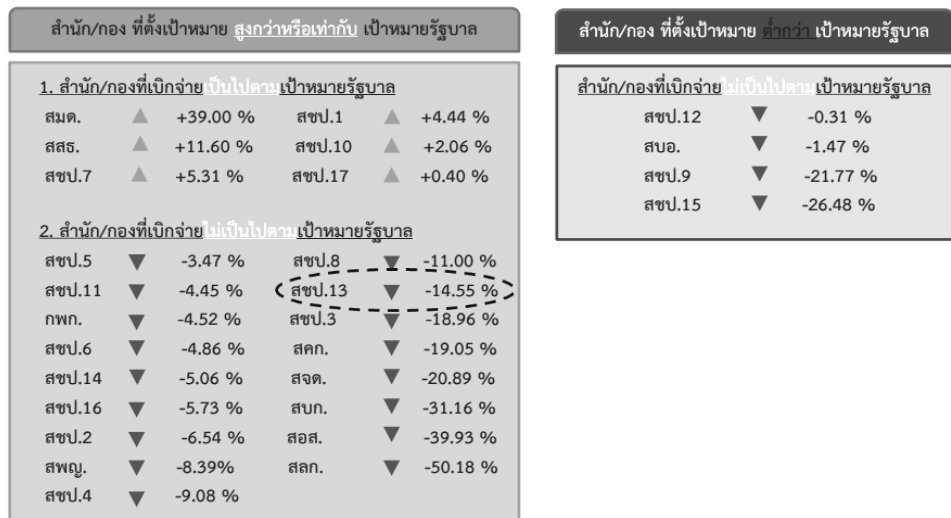

๔. กราฟแสดงจัดสรรผลเบิกจ่าย งบรายจ่ายลงทุนประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ รายโครงการ สชป.๑๓ GFMIS ณ วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

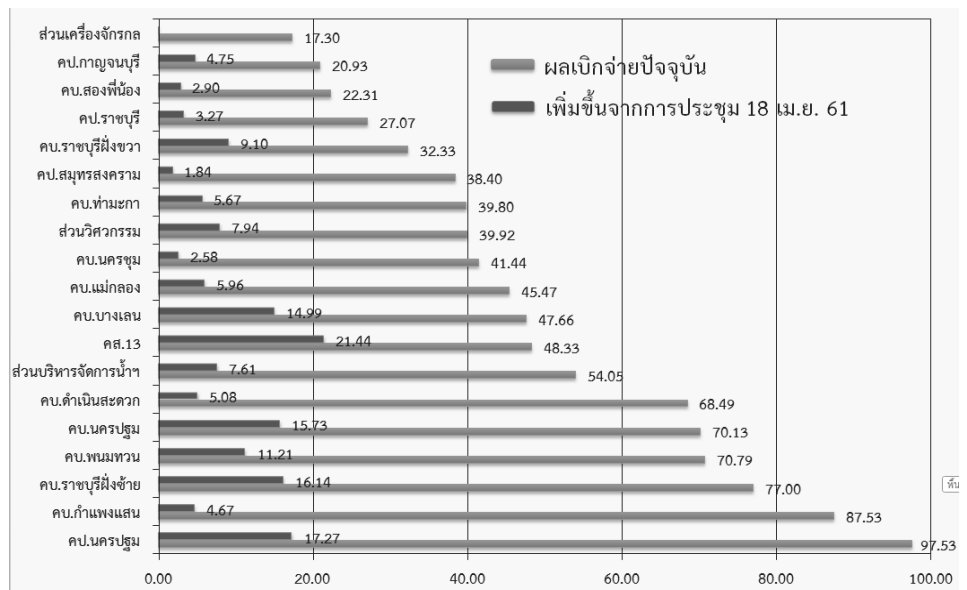

๕. ระบบติดตามออนไลน์ (งบ พ.ร.บ.) ข้อมูลจากระบบติดตาม online ณ วันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๐ น.

ลำดับ	ชื่อโครงการ	จำนวน รายการงาน ทั้งหมด	แผนงาน Cash Flow	แผนเงิน เบิกจ่าย	วันอนุมัติแผน จัดซื้อ-จัดจ้าง	ผลการจัดซื้อ- จัดจ้าง งาน จ้างมา	ผลการ จัดซื้อ-จัดจ้าง ซื้อวัสดุ	รูปภาพที่ สำคัญ 2 รูปภาพ	รูปภาพ ขั้นตอน											
									ก่อน ปฏิบัติงาน	กำหนดวง งบ/งบ ประชาชน		รูปภาพขั้นตอน			พื้นที่ เดิน	การ ตรวจสอบ ระหว่าง ดำเนินการ	การตรวจ เห็นโดย ผู้บังคับบัญชา	การประชุม ผู้เกี่ยวข้อง (ผู้เกี่ยวข้อง)	ตรวจรับ และส่ง มอบงาน	การ รายงาน ผลการ ปฏิบัติงาน
										ก่อน	ระหว่าง	หลัง	ก่อน	ระหว่าง						
1	ส่วนบริหารจัดการน้ำและบำรุงรักษา	11	11	11	11	-	11	8	11	8	8	8	-		5	2	4	-	-	
2	ส่วนเครื่องจักรกล	1	1	1	1	-	1	1	1	1	1	1	-	1	1	1	1	-	-	
3	ส่วนวิศวกรรม	1	-	-	1	-	-	1	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	
4	โครงการชลประทานกาญจนบุรี	53	53	53	53	-	53	53	53	52	53	46	45	46	23	11	52	5	5	
5	โครงการชลประทานนครปฐม	3	3	3	3	-	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
6	โครงการชลประทานราชบุรี	30	30	30	30	-	27	8	30	19	15	12	10	23	10	10	21	10	15	
7	โครงการชลประทานสมุทรสงคราม	12	12	12	12	1	12	12	12	12	12	12	-	12	6	12	12	-	-	
8	โครงการก่อสร้าง 13	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	5	-	5	5	5	5	-	-	
9	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน	22	22	22	22	-	22	22	22	22	22	22	10	22	22	22	-	-	-	
10	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่กลอง	5	5	5	5	-	5	5	5	5	5	5	1	5	5	5	5	-	-	
11	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก	32	32	32	32	18	13	30	32	32	32	29	22	30	26	25	32	22	21	
12	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาท่ามะกา	25	25	25	25	-	25	25	25	25	25	4	24	7	1	24	-	-	-	
13	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	18	18	18	18	1	18	18	18	16	18	18	14	18	16	11	18	-	-	
14	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม	87	87	87	87	23	87	45	87	56	86	57	41	81	30	23	-	11	-	
15	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน	35	35	35	35	3	30	35	35	35	34	14	1	10	9	9	-	-	6	
16	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน	39	39	39	39	2	39	39	39	39	39	37	35	38	25	-	37	-	23	
17	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง	30	30	30	30	1	30	-	30	-	30	13	8	-	-	-	-	-	-	
18	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา	35	35	35	35	2	35	33	35	35	35	26	-	35	4	3	35	-	-	
19	โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย	31	30	30	31	7	31	30	30	30	30	27	-	27	19	10	30	-	-	
	รวม	475	473	473	475	58	447	373	474	396	454	361	194	287	216	154	301	51	73	

ผส.ชป.๑๓

กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. วันจันทร์ที่ ๒๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๐.๐๐ น.นัดประชุมหารือกับ ผผง.ชป.๑๓ ผจบ.ชป.๑๓ และ ผวศ.ชป.๑๓ เรื่องเงินที่เหลือจากการจัดหา งานเร่งด่วนที่สำนักรับมาจะดำเนินการ และเรื่องคืนเงินพร้อมกับของบประมาณจะดำเนินการพร้อมกันไป

๒. โครงการใดที่มีแผนอยู่แล้วที่มีความพร้อม ขอให้แจ้งส่วนแผนงานด้วย

๓. รอนายกรัฐมนตรีได้ติดตามงานพื้นที่แปลงใหญ่ ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน ทั้งนี้สำนักได้เตรียมความพร้อมให้กับโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลนแล้ว

๔. งานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม เรื่องมูลนิธิชัยพัฒนา จะประสานงาน เรื่องการขอใช้งบมูลนิธิให้

๔.๒ การเตรียมความพร้อมของงานปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ โดย ผผง.ชป.๑๓

รายการงานของ สชป.๑๓ มีทั้งหมด จำนวน ๔๘๖ รายการ ส่งประมาณการไปแล้ว จำนวน ๔๓๘ รายการ ที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการ จำนวน ๔๓ รายการ และมีการแจ้งยกเลิกในการตรวจสอบ จำนวน ๕ รายการ ขอแจ้งโครงการที่ยังไม่ได้ส่งประมาณการดังนี้

- | | | |
|--|----------|--------|
| ๑. ส่วนวิศวกรรมบริหาร | จำนวน ๑ | รายการ |
| ๒. ส่วนบริหารและจัดการน้ำและบำรุงรักษา | จำนวน ๑๑ | รายการ |
| ๓. โครงการชลประทานกาญจนบุรี | จำนวน ๑๒ | รายการ |
| ๔. โครงการชลประทานราชบุรี | จำนวน ๑ | รายการ |
| ๕. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาดำเนินสะดวก | จำนวน ๕ | รายการ |
| ๖. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน | จำนวน ๕ | รายการ |
| ๗. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย | จำนวน ๘ | รายการ |

ผผง.ชป.๑๓ ได้สั่งการไว้ว่าจะส่งให้กองแผนงานวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เนื่องจาก
รจร. จะติดตามงานในเดือนมิถุนายน ฝ่ายแผนงานขอให้ส่งภายในวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เพื่อจะได้
ตรวจสอบและแก้ไขหากมีข้อผิดพลาด

รายการที่ขอทราบความก้าวหน้าของแบบ ดังนี้

๑. มีโครงการฝายทดน้ำทุ่งสามพร้อมชุดลอก ของโครงการชลประทานราชบุรี
และโครงการอนุรักษ์พันธุพืช ของโครงการชลประทานกาญจนบุรี ตอนนี้ได้ใช้คักกับทางกองแผนงานแล้วล่าสุด
อยู่ระหว่างดำเนินการ

๒. งานปรับปรุงสระศูนย์เรียนรู้พนมทวน ของโครงการชลประทานกาญจนบุรี
อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน

๓. งานโครงการชุดลอกโดยรถชุดดำเนิน ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งซ้าย
อยู่ชั้นตอนที่ ๓

๔. งานฝายปรับปรุงอาคารบังคับน้ำปลายคลอง ของโครงการชลประทานนครปฐม
อยู่ลำดับที่ ๓

๕. งาน ปตร. กม.๕+๓๐๐ คันกั้นน้ำเค็มสายพรมแดง ของโครงการชลประทาน
สมุทรสงคราม ยังไม่ได้ดำเนินการ

๖. งานประตูระบายน้ำทับเทียม ของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา
อยู่ลำดับที่ ๒ ขอทราบความก้าวหน้าเรื่องแบบว่าจะเสร็จเมื่อไหร่ เนื่องจากงานตัวนี้ได้ส่งเข้าสำนักงบทหมดแล้ว
ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้

ผผ.ชป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ดังนี้

๑. ให้ ตป.ชป.๑๓ ทำหนังสือแจ้งโครงการขอทราบความก้าวหน้าของแบบตามรายชื่อที่
ผผ.ชป.๑๓ แจ้ง

๒. ให้ ผผ.ชป.๑๓ สรุปรายละเอียดแบบเตรียมความพร้อมงานปี ๒๕๖๒ ที่ยังไม่ได้
ดำเนินการและดำเนินการแล้ว รจร. สั่งการว่าเนื่องจากแต่ละปีมีปัญหาเรื่องการเบิกจ่าย และการเตรียมความพร้อม
ในเดือนมิถุนายน รจร. จะประชุมเตรียมความพร้อมงบประมาณปี ๒๕๖๒

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

๔.๓ สำนักงานก่อสร้างชลประทานขนาดกลางที่ ๑๓ โดย ผผ.๑๓

มีงานดำเนินการ ๕ รายการงาน ผลการเบิกจ่ายรวมของโครงการ ร้อยละ ๗๖.๙๔ ดังนี้

๑. โครงการอ่างเก็บน้ำห้วยลำทรายพร้อมระบบส่งน้ำ มี ๒ ส่วน

๑.๑ ทำนบดิน ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ ๕๗

๑.๒ อาคารประกอบส่วนอื่นๆ ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ ๕๙.๗๖

๒. อาคารทดน้ำบ้านช่องด่านพร้อมอาคารประกอบ ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ ๓๔.๓๑

๓. อาคารทดน้ำบ้านวังกุ่มพร้อมระบบส่งน้ำ ผลงานปัจจุบัน ร้อยละ ๘๔

โครงการเปิดใหม่ ๒ โครงการ

๑. ระบบส่งน้ำพร้อมอาคารประกอบอ่างเก็บน้ำห้วยกระพ้อยพระราชดำริ ผลงาน ร้อยละ ๑๐๐
๒. สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอาคารประกอบคลองโตนโด - รางสาละ มี ๒ ส่วน
 - ๒.๑ สถานีสูบน้ำพร้อมระบบส่งน้ำอาคารประกอบ ผลงาน ร้อยละ ๖๖.๑๓
 - ๒.๒ ค่าส่วนประกอบอื่นๆ ผลงาน ร้อยละ ๕๐.๑๒

มติที่ประชุม

รับทราบ

- ๔.๔ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๗ โดย ผจจ.๒๗ มีงานที่รับผิดชอบ ๘ งาน ผลงานก่อสร้างภาพรวม ร้อยละ ๗๔ ผลการเบิกจ่าย ร้อยละ ๗๓.๗๘

ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

- ๔.๕ สำนักงานจัดรูปที่ดินและจัดระบบน้ำเพื่อเกษตรกรรมที่ ๒๘ โดย ผจจ.๒๘ - ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

มติที่ประชุม

รับทราบ

- ๔.๖ หน่วยงานฝาก

- ๔.๖.๑ ศูนย์อุทกวิทยาชลประทานภาคตะวันตก โดย ผอช.ภาคตะวันตก - ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

- ๔.๖.๒ สถานีทดลองการใช้น้ำชลประทานที่ ๙ ท่าม่วง โดย ทน.๙ บอ.

๑. งานโครงการศึกษาเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการใช้น้ำชลประทานของพืชและโครงการระบบสูบน้ำการแพร่กระจายน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ภายใต้เกษตรทฤษฎีใหม่ใช้น้ำปลอดภัย ได้ดำเนินการทั้งการปลูกพืชวิธีการส่งน้ำโดยใช้พลังงานแสงอาทิตย์ ระบบโซล่าเซลล์ได้ดำเนินการติดตั้งเสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยมีทั้งหมด ๖ แผง ใช้แบตเตอรี่ ๘ ลูก มีความจุอยู่ที่ลูกละ ๑๖๕ แอมป์ สามารถปั้มน้ำโดยใช้วิธีการส่งน้ำแบบน้ำหยด แบบสปริงเกอร์กับเครื่องต่างๆ

๒. การปลูกหญ้าแฝก ได้สนับสนุนหญ้าแฝกให้กับเกษตรกรและหน่วยราชการ ล่าสุดได้ให้ความอนุเคราะห์กับ โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านถ้ำหิน ทั้งหมด ๖,๐๐๐ ถูง จำนวน ๓๐,๐๐๐ ต้น

๓. ศูนย์เรียนรู้เรื่องเกษตรชลประทานได้ทำงานร่วมกับศูนย์พันมิตร ๘๘๒ ศูนย์ ในเขตจังหวัดกาญจนบุรี ๑๓ อำเภอ ๑๓ ศูนย์หลัก และมีศูนย์ย่อยอีก ได้ให้ความร่วมมือไปจัดนิทรรศการให้ความรู้ต่างๆ ตั้งเป็นศูนย์พันมิตรในสถานีมี ๔ ฐานเรียนรู้

๔. ศูนย์การศึกษานอกโรงเรียนได้ขอเข้าศึกษาดูงานโครงการเกี่ยวกับ Smart Farmer ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้าศึกษาดูงาน

- ๔.๖.๓ ฝ่ายเครื่องจักรกลรถชุดที่ ๖ โดย คช.๖ คก.

ได้รับงบประมาณจากสำนักงานชลประทานที่ ๑๓ จำนวน ๔ โครงการ ๒๓ คลอง วงเงิน ๑๘,๔๐๐,๐๐๐ บาท ปริมาณดิน ๙๖๐,๐๐๐ คิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๖๘ ปริมาณงานร้อยละ ๗๖ ดังนี้

๑. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครชุม จำนวน ๑ คลอง ผลงานร้อยละ ๑๐๐

๒. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาราชบุรีฝั่งขวา จำนวน ๖ คลอง
เสร็จแล้วจำนวน ๓ คลอง เหลือ ๓ คลอง เงินงบประมาณ ๔ ล้านบาท
เบิกจ่ายไปแล้ว ๒ ล้านบาท

๓. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน จำนวน ๑๐ คลอง
เสร็จแล้วจำนวน ๘ คลอง เหลือ ๒ คลอง งบประมาณ ๘ ล้านบาท
ไตรมาสดิน ๔ แสนกว่าคิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๑ ผลงานร้อยละ ๙๙

๔. โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาสองพี่น้อง จำนวน ๖ คลอง
เสร็จแล้วจำนวน ๔ คลอง เหลือ ๒ คลอง งบประมาณ ๕ ล้านบาท
ไตรมาสดิน ๒ แสน ๖ หมื่นกว่าคิว ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๕๑ ผลงานร้อยละ ๕๑

๔.๖.๔ ฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ โดย คร.๖ คก.

แผนกำจัดวัชพืช ผลงานจะครบ ร้อยละ ๑๐๐ ภาพรวมของการเบิกจ่ายร้อยละ ๙๗ งานชุดลอกปริมาณงานร้อยละ ๕๙ ผลการเบิกจ่ายร้อยละ ๘๒ ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน และขณะนี้เครื่องจักรปฏิบัติงานที่โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพระพิมล รว.๑๐ และ รว.๑๕ เรือกำจัดวัชพืช อยู่ที่คลองโยง รถ.๘๓๘ อยู่ที่ประตูน้ำพระพิมล

ผจบ.ขป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติม ว่างานของโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาบางเลน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษานครปฐม กำหนดเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม ขอให้โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสนรับช่วงต่อ และประสานงานกับทางฝ่ายเครื่องจักรกลเรือชุดและเรือกำจัดวัชพืชที่ ๖ ด้วย และให้ คร.๖ คก. ทำแผนงานส่งให้กับ ผจบ.ขป.๑๓ เพื่อจะได้แจ้งกับทางโครงการและผู้ร้องเรียนเรื่องเครื่องจักรในการลงพื้นที่

ผส.ขป.๑๓ กล่าวเพิ่มเติมว่า ขอให้โครงการตรวจสอบปริมาณวัชพืช ถ่ายรูป และทำแผนงานรายงานมาให้ ผจบ.ขป.๑๓ จะได้ทำหนังสือถึงสำนักเครื่องจักรกล และเชิญ รรช. มาดูพื้นที่ที่ถูกร้องเรียน

๔.๖.๕ ฝ่ายเครื่องจักรกลก่อสร้างงานดินที่ ๖ โดย คส.๖ คก.

- ไม่มีปัญหาอุปสรรคในการดำเนินงาน

๔.๖.๖ ฝ่ายสำรวจทำแผนที่ทางพื้นดินที่ ๑๓ สำนักสำรวจด้านวิศวกรรมและธรณีวิทยา โดย ผด.๑๓ สธ.

มีงานโครงการพระราชดำริ ๔ โครงการ ดำเนินการสำรวจแล้ว ๑ โครงการ เหลืออีก ๓ โครงการ กำลังดำเนินการสำรวจ แล้วเสร็จสิ้นเดือนพฤษภาคม

๔.๖.๗ ฝ่ายจัดหาที่ดินที่ ๕ ส่วนจัดหาที่ดินที่ ๓ โดย จด.๕/๓ มด.

งานอ่างเก็บน้ำห้วยลำทราย รอเงินงบประมาณยังไม่ได้ทำการเบิกจ่าย

มติที่ประชุม **รับทราบ**

วาระที่ ๕ **เรื่องเพื่อพิจารณา**

๕.๑ การเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ ตามที่สำนักได้ดำเนินการเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำ เสนอกรมพิจารณา รวม ๑๒๔ ราย ปรากฏว่ามีบางรายขาดคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง จำนวน ๒๙ ราย จึงไม่สามารถเปลี่ยนสายงาน (ชื่อตำแหน่ง) และกลุ่มงานลูกจ้างประจำได้ สืบเนื่องจากการมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่ ต้องจัดทำเป็นลายลักษณ์อักษร ดังนี้

๑. ก่อนปี ๒๕๕๓ สามารถใช้คำสั่ง ส่วน/โครงการ หรือหนังสืออนุมัติให้ปฏิบัติหน้าที่

๒. ตั้งแต่ปี ๒๕๕๓ กรมชลประทานได้มอบอำนาจให้ ผส.ชป.๑๓ เห็นชอบและลงนามคำสั่งมอบหมายให้ลูกจ้างประจำในสังกัดสำนักปฏิบัติหน้าที่ภายในสำนัก ดังนั้นหลักฐานที่ใช้ประกอบการพิจารณาจะต้องเป็นคำสั่งกรมชลประทาน ที่ จ ๒๒ /.... / ปีงบประมาณนั้นๆ การจัดทำคำสั่งดังกล่าวนี้ ส่วน/โครงการจะต้องพิจารณาเหตุผลความจำเป็นและความเหมาะสมสอดคล้องของตำแหน่งตามภารกิจ โดยคำนึงถึงหน้าที่ความรับผิดชอบ ลักษณะงานที่ปฏิบัติและคุณภาพงานที่มอบหมายตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร ๑๐๐๘/ว.๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ เรื่องการจัดระบบตำแหน่งลูกจ้างประจำของส่วนราชการ โดยจัดทำแบบบรรยายลักษณะงาน (Job Description) ของตำแหน่งลูกจ้างประจำ (แบบ ลปจ.๒) เสนอสำนักโดยเน้นย้ำหัวข้อปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายใส่ข้อมูลให้ละเอียดสอดคล้องกับหน้าที่โดยย่อของตำแหน่ง ตามหนังสือที่ นร๑๐๐๘/ว.๑๔ ลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๕๓ ซึ่งการจัดทำคำสั่งกรมชลประทาน เรื่องการมอบหมายให้ลูกจ้างประจำปฏิบัติหน้าที่จะทำทุกๆ ปีงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๒ ขอให้ ส่วน/โครงการ จัดส่ง ลปจ.๒ ภายในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑ ด้วย หาก ส่วน/โครงการ ยังเข้าใจคลาดเคลื่อนในการมอบหมายหน้าที่ให้ลูกจ้างประจำ ขอให้ประสานงานกับ ผบท.ชป.๑๓ เพื่อจะได้จัดที่มงานออกไปชี้แจงสร้างความเข้าใจ เพื่อให้เกิดความเท่าเทียมกันในโอกาสต่อไป

๕.๒ การประเมินบุคคลเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการระดับชำนาญการสายงานวิศวกรรม ขอให้ ผอ.โครงการ ติดตามและกำกับให้วิศวกรชลประทานในสังกัดที่ครบระยะเวลาการประเมินส่งผลงานด้วย เช่น โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน และโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาพนมทวน ทั้งนี้จะต้องเป็นไปตามประกาศ ก.พ. กรมชลประทาน ลงวันที่ ๑๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๗

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

วาระที่ ๖ เรื่องอื่นๆ

๖.๑ องค์พระพิฆเนศ เกิดความเสียหายเนื่องจากลมพายุพัด สำนักจะปรับปรุงห้องกระจกโดยรอบองค์พระพิฆเนศ โดยใช้งบประมาณ จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ปาง “โศกทรัพย์” พระนามองค์พญานาค “จันทระคุปต์นาคราชวิสุทธเทวา” เป็นพญานาคประจำองค์พระพิฆเนศมีพระวรกายสีฟ้า เคียรสีทอง และเป็นเทพวิศวกรมหามัธยมสวรรค์ชั้นจตุรหาราชิกา ทำพิธีบวงสรวง ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๖.๐๐ น.

๖.๒ กำหนดการวันวิสาขบูชา ในวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ บริเวณองค์พระหลวงพ่อเขื่อนแม่กลอง จึงขอเชิญผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ร่วมทำบุญตามกำหนดการดังนี้

เวลา ๐๖.๐๐ น. บวงสรวง ตั้งองค์พระพิฆเนศ

เวลา ๐๖.๑๕ น. ถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์

เวลา ๐๖.๔๕ น. ตักบาตรข้าวสาร อาหารแห้ง

เวลา ๐๙.๓๐ น. ปล่อยพันธุ์ปลา

เวลา ๑๘.๓๐ น. สวดมนต์ นั่งสมาธิ

เวลา ๑๙.๐๐ น. เวียนเทียนรอบองค์พระ

เวลา ๑๙.๓๐ น. มหรสพลีเก ฉลององค์พระพิฆเนศ

๖.๓ เมื่อวันที่ ๑๖ พฤษภาคม ๒๕๖๑ สำนักได้ดำเนินการรับรายงานตัวพนักงานราชการ ๑๔ อัตรา คือ นายช่างชลประทาน ๑๒ อัตรา นายช่างสำรวจ ๑ อัตรา และ ช่างไฟฟ้า ๑ อัตรา

๖.๔ การประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษา/โครงการชลประทาน ระดับภาค (ภาคใต้) ประจำปี ๒๕๖๒ กำหนดการประเมิน ในวันพุธที่ ๒๓ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ดังนี้

๑. เวลา ๐๘.๓๐ น. - ๑๐.๐๐ น. ตรวจสอบประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๔ โครงการชลประทานกาญจนบุรี ณ ห้องประชุม สชป.๑๓

๒. เวลา ๑๐.๑๕ น. - ๑๑.๔๕ น. ตรวจสอบประเมินการพัฒนาคุณภาพการบริหารฯ ฝ่ายส่งน้ำและบำรุงรักษาที่ ๓ โครงการส่งน้ำและบำรุงรักษากำแพงแสน ณ ห้องประชุม สชป.๑๓

๓. ขอมอบหมายให้ ผจบ.ชป.๑๓ รับผิดชอบเรื่องที่พักและอาหาร และ ผคก.ชป.๑๓ จัดเตรียมยานพาหนะในการรับ - ส่งคณะทำงานด้วย

มติที่ประชุม รับทราบและดำเนินการ

เลิกประชุมเวลา ๑๕.๕๐ น.

นางสาวณัฐกานต์ น้ำเพชร ผู้จัดรายงานการประชุม

นายเอกวิทย์ ก้านเหลือง ผู้ตรวจรายงานการประชุม
